



2022年12月



Ambrico和Clinker Place雨水管网升级工程

工程最新进展

时至年末，我们衷心感谢各位居民耐心等待我们完成这些重要工程。尽管新冠疫情导致工程中中断了一段时间，但今年我们的工程取得了很大进展，可按计划于2023年中旬完成。

迄今为止，我们的团队已完成了Rankin Avenue和Ambrico Place竖井3和2的施工。当地幼儿园小朋友在我们的隧道掘进机作画并将其命名为Princess Twilight Super Worm。她从Rankin Avenue开始挖隧道，并于11月初到Ambrico Place破土而出，恰好赶上这项社区活动。

我们的团队目前在Melview Place竖井开展挖掘作业，为隧道最终阶段做好准备。挖掘作业将于2023年1月初完成。在开展Melview Place竖井挖掘作业的同时，我们还将隧道设备从Rankin Avenue转移到了Ambrico Reserve。

我们还开始了Rankin Avenue施工现场的雨水管明沟部分作业。预期这一部分的隧道工程将于夏季末前完成。

社区活动

感谢您百忙之中花时间参加我们于11月26日（星期六）举办的社区活动。许多人前来参观施工围栏后的进展情况，与我们的专业人员交谈，还拍了一些照片。

我们的项目经理与志愿者一起烤香肠，还有当地咖啡师为大家制作咖啡。Te Toi Uku - Crown Lynn & Clayworks博物馆员工设立了一个摊位，和居民一起用黏土一起制作圣诞饰品。

Waitakere体育中心和New Lynn社区中心在公园设置摊位，邀请当地一名DJ，举办一系列游戏、图书和活动。

当地消防队还在早上开来了消防车——小朋友们的最爱！

借此机会，感谢每个团队一起打造有趣的互动式活动。希望你们和我们一样度过了美好时光。



圣诞假期

施工团队将于2022年12月22日（星期四）至2023年1月4日（星期三）休息。在此期间，施工工地由CCTV监控并有保安巡逻。如您就这段时间对工地有何担忧和问题，请拨打027 384 6576联系Martin Hughes。

为保护竖井内的电子设备，我们会运行Rankin Avenue和Ambrico Place竖井的水泵。这些水泵由Rankin Avenue工地的发电机供电，Ambrico Place竖井不会有任何噪音。

Ambrico Place工地配备应急备用水泵和发电机。如主水泵不工作，备用水泵和发电机会自动运行。触发自动运行时，会自动通知我们的团队成员，他们就会来工地查看。万一触发自动运行，可拨打027 384 6576联系Martin Hughes。

2023年初


我们将于2023年1月4日（星期三）复工，并计划于2023年1月5日（星期四）启动Princess Twilight Super Worm，进行最后施工。在隧道工程的这一阶段，我们会使用大型发电机，从Ambrico Place工地为TBM供电。发电机将于星期一至星期五早上7点半至下午6点运行。我们预期于2023年2月完成隧道工程。

完成隧道工程后，会开展隧道设备拆除作业。我们还将用水泥填补TBM在水管外侧和地面留下的空隙。这将花费约四周的时间。

Manawa湿地的雨水管排水口施工将在Melview Place竖井完工后立即开始。排水口施工将于2023年夏季末前完成。施工区域已设置围栏。请继续使用我们修建的替代道路，进入水流上方的桥梁。

联系我们

欲了解更多工程相关信息，请发送邮件至 clinkerplacehw@aucklandcouncil.govt.nz 联系我们。

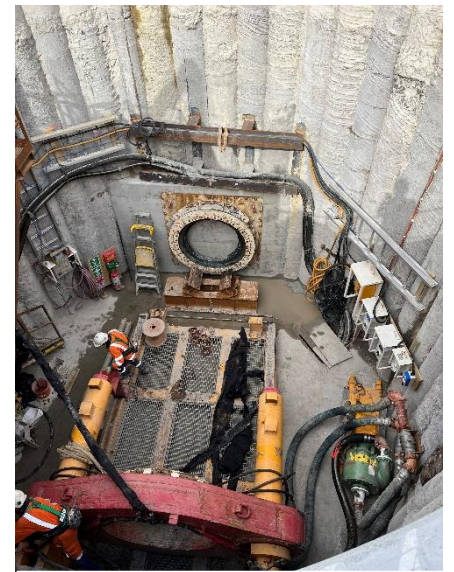

TBM入口——Ambrico Place竖井



需要帮助？



访问：aucklandcouncil.govt.nz/clinkerplacehw



电话：09 301 0101



电子邮箱：clinkerplaceHW@aucklandcouncil.govt.nz
